

Relatório: Execução Mensal de Obras e Serviços

CONCESSIONÁRIA	EPR LITORAL PIONEIRO
RODOVIAS	Lote 02: Rodovias Federais BR-277/153/369/PR e Rodovias Estaduais PR-92/151/239/407/408/411/508/804/855
TRECHO	BR-153/PR – km inicial – 0,000 e km final 52,500 BR-153/PR – Acesso – km inicial 0,000 e km final 0,400 BR-277/PR – Acesso – km inicial 0,000 e km final 1,500 BR-277/PR – Acesso – km inicial 0,000 e km final 2,900 BR-277/PR – Acesso – km inicial 1,500 e km final 8,100 BR-277/PR – Acesso – km inicial 0,000 e km final 13,300 BR-277/PR – km inicial 0,000 e km final 70,400 BR-369/PR – km inicial 1,000 e km final 51,800 BR-369/PR – km inicial 60,900 e km final 88,200 PR-092/PR – km inicial 199,500 e km final 327,300 PR-151/PR – km inicial 176,490 e km final 319,710 PR-239/PR – km inicial 0,000 e km final 12,590 PR-407/PR – km inicial 0,000 e km final 18,850 PR-408/PR – km inicial 0,000 e km final 9,730 PR-408/PR – km inicial 11,240 e km final 22,990 PR-411/PR – km inicial 1,070 e km final 14,110 PR-508/PR – km inicial 0,000 e km final 31,210 PR-804/PR – km inicial 0,000 e km final 2,710 PR-855/PR – km inicial 0,000 e km final 8,060
EXTENSÃO	604,660 km

CURITIBA, 05 DE JULHO DE 2026

ÍNDICE

1.	INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO	3
1.1	INTRODUÇÃO	3
1.2	INFORMAÇÕES CONTRATUAIS.....	5
1.3	MAPAS DE SITUAÇÃO	6
2.	ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS	7
2.1	DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS	7
2.2	LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS	8
2.3	INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO.....	11
3.	RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.....	18
4.	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	35
5.	TERMO DE ENCERRAMENTO.....	36

1. INFORMAÇÕES DA CONCESSÃO

1.1 INTRODUÇÃO

A EPR LITORAL PIONEIRO, detentora do Contrato de Concessão: Edital de Concessão nº 02/2023, tem por objeto a exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, manutenção, conservação, ampliação de capacidade e implantação de melhorias no sistema rodoviário, bem como implantar os sistemas de operação, de arrecadação de pedágio e de monitoração do sistema rodoviário, no prazo e nas condições estabelecidas no Contrato e segundo os Parâmetros de Desempenho e especificações mínimas estabelecidas no Programa de Exploração Rodovia - PER.

O Programa de Exploração da Rodovia (PER) especifica todas as condições para execução do contrato, caracterizando todos os serviços e obras previstos para realização pela CONCESSIONÁRIA ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes técnicas, normas e, principalmente, os parâmetros de desempenho e cronogramas de execução que devem ser observados para todas as obras e serviços previstos.

A partir de fevereiro/24 teve início o Contrato de Concessão, tendo como uma das obrigações contratuais a fase de Trabalhos Iniciais, que é o conjunto de obras e intervenções no trecho concedido visando proporcionar trafegabilidade com parâmetros técnicos e de segurança mínimos aos usuários da rodovia no trecho sob concessão.

Em fevereiro/2025, ao final da fase de Trabalhos iniciais se iniciou o período de Recuperação, essa fase contempla obras e serviços, incluindo melhorias funcionais e operacionais, além daqueles de cunho estrutural no pavimento e nos demais elementos do Sistema Rodoviário.

A partir de fevereiro/2026 teve início a Frente de Ampliação de Capacidade, Melhorias e Manutenção do Nível de Serviço, responsável por implementar intervenções que elevam o desempenho operacional do Sistema Rodoviário. Essa etapa contempla obras destinadas a ampliar a fluidez do tráfego, reforçar

a segurança viária e adequar a infraestrutura a padrões superiores de qualidade, incorporando soluções que também asseguram a proteção ambiental e a preservação das condições operacionais ao longo de todo o trecho concedido.



1.2 INFORMAÇÕES CONTRATUAIS

Na Tabela 01 é mostrado um resumo dos dados contratuais.

Tabela 1 - Dados Contratuais

Concessionária	EPR LITORAL PIONEIRO
Contrato nº	002/2023
Escopo do Contrato	O objeto do Contrato é a Concessão para exploração da infraestrutura e da prestação do serviço público de recuperação, operação, manutenção, monitoração, conservação, implantação de melhorias, ampliação de capacidade e manutenção do nível de serviço do Sistema Rodoviário, no prazo e nas condições previstas no Contrato e no PER, segundo o Escopo, os Parâmetros de Desempenho e os Parâmetros Técnicos estabelecidos.
Assinatura do contrato	30/01/24
Início da concessão	28/02/24
Início da Cobrança de Pedágio	23/03/24
Rodovia	Lote 02: Rodovias Federais BR-277/153/369/PR e Rodovias Estaduais PR-92/151/239/407/408/411/508/804/855
Extensão	604,660 km
Prazo	30 anos

1.3 MAPAS DE SITUAÇÃO

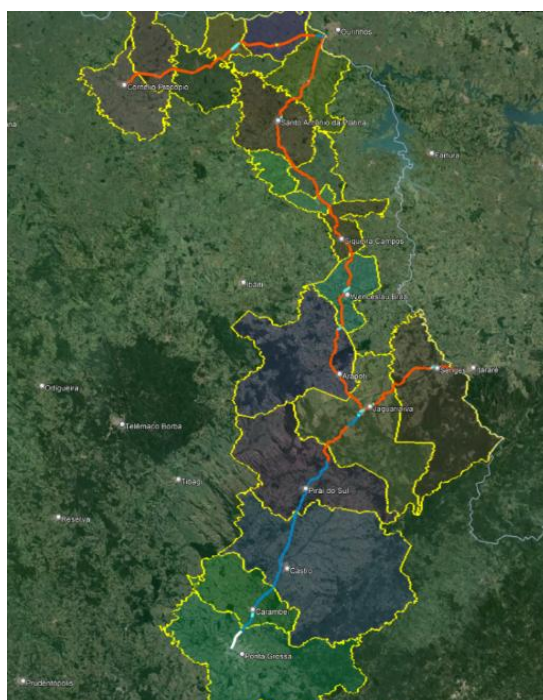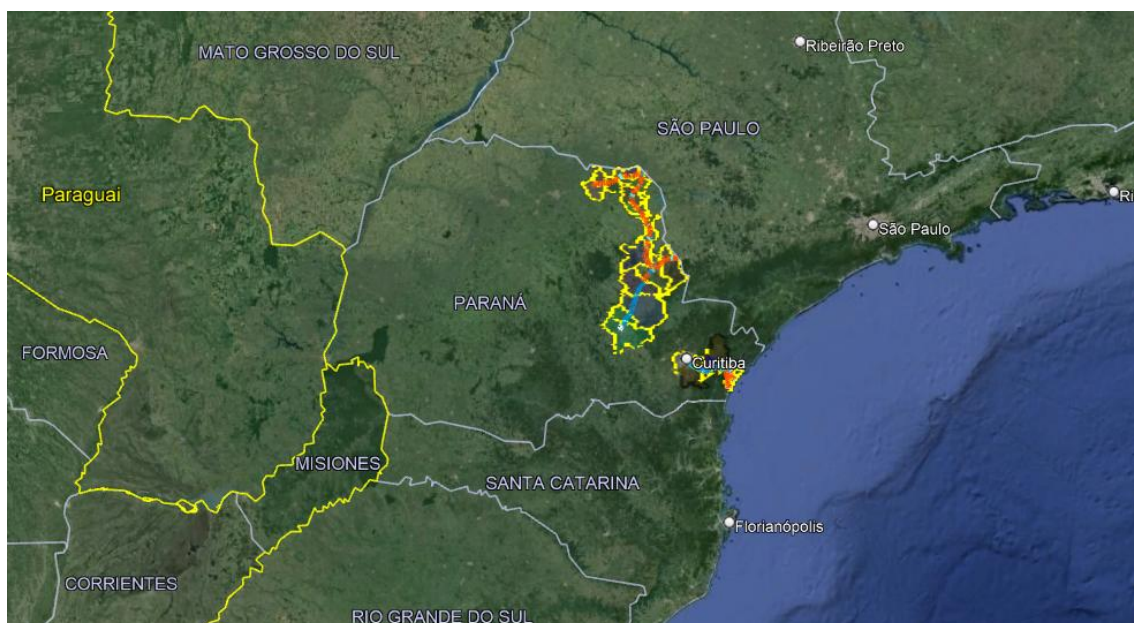

Trecho: Norte



Trecho: Sul

2. ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DAS PRINCIPAIS OBRAS

2.1 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS OBRAS

Pavimento

Os serviços relacionados ao pavimento terão por objetivo restabelecer níveis de serventia mínimos, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para a frente de Recuperação visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

Sinalização e Elementos de Proteção e Segurança Viária

Manutenção da sinalização horizontal, vertical e aérea e das defensas metálicas das rodovias concedidas, conforme definidos nos parâmetros de desempenho do PER para frente de Recuperação, visando o conforto e segurança dos usuários da Rodovia.

Sistema de Drenagem e Obras de Artes Correntes (OAC's)

Os sistemas de drenagem e OAC's da rodovia estão recebendo os serviços previstos de recuperação e de complementação, com priorização estabelecida de acordo com a necessidade, baseada nos resultados do estudo realizado para a frente de Recuperação, de modo a garantir a segurança dos usuários.

2.2 LOCALIZAÇÃO DAS OBRAS

Concomitante às obrigações contratuais constantes nas exigências de entrega de trabalhos iniciais, a Concessionária vem produzindo grande esforço e volume de serviços ao longo de toda a malha concedida.

Pensando em um melhor aproveitamento de logística e distribuição de equipes, considera-se 3 sublotes dentro da concessão para a realização de serviços voltados para a Conserva de Rotina, sendo estes designados da seguinte maneira:

- **Norte Pioneiro:** Segmento compreendido entre Cornélio Procopio e Ourinhos (BR-369, BR-153 e PR-855), além do segmento entre Ourinhos à Arapoti (km 236 – PR092);
- **Campos Gerais:** Segmento compreendido entre Arapoti e Jaguariaíva (segmento restante da PR092), além do segmento entre Itararé e Ponta Grossa (PR-151 e PR-239);
- **Litoral:** Segmento compreendido entre Curitiba e Paranaguá (BR-277) além de todas as rodovias estaduais com destinado à Morretes e Antonina (PR-804, PR-411 e PR-408), bem como as rodovias que conectam ao Litoral Paranaense (PR-508 e PR-407);

Através desta segmentação, a Concessionária compôs adequados efetivos para contratação de prestadores de serviços voltados à execução das demandas previstas na campanha de Recuperação.

Diariamente, a Concessionária possui frentes atuantes em cada segmento supracitado, voltadas para realização de roçada manual e mecanizada, equipes voltadas para atividades de poda vertical, equipes voltadas para atividades de recuperação civil como reconstrução, implantação e desobstrução de elementos de drenagem (OAC), equipes voltadas para recuperação civil de elementos de proteção e segurança e obras de arte especiais (OAE), equipes voltadas para recuperação de elementos de proteção e segurança (EPS), equipes volantes para atuação junto às operações tapa

buraco, limpeza de sinalização vertical, e coleta de resíduos das bases operacionais. Ainda consta com equipes compostas por retroescavadeira e caminhão basculante para apoio em recuperação de terraplenos, erosões e atendimentos emergenciais diversos para apoio em liberação de tráfego oriundo de derramamento de cargas proveniente de acidentes. Possui também efetivo com minicarregadeira e caminhão tipo roll-on, atuante em apoios para desobstrução de drenagens superficiais.

Durante o período do mês de janeiro, a Concessionária intensificou as ações reconstrução e limpeza de elementos de drenagens de OAC's e roçada. No decorrer dessa campanha também foi executado serviços de tapa-buraco, sinalização vertical e manutenção dos dispositivos de proteção verificando condições de ancoragem e substituição de elementos danificados.

Quanto às atividades de pavimento, a Concessionária possui frentes de serviços concentradas em atuações junto às rodovias PR-092, BR-153/PR, BR-369/PR, PR-151 e BR-277/PR, com patrulhas voltadas para serviços de fresagem e recomposição, reparos localizados, reparos profundos e frentes de refilamento superficial, viabilizando melhor capacidade de drenagem da plataforma. Todo serviço realizado possui a revitalização dos dispositivos de sinalização horizontal, garantindo que se evite qualquer situação de liberação de via sem a adequada canalização do tráfego local, aderente à fluidez e segurança viária.

Na Tabela-02 é apresentada a localização das obras executadas no mês de junho de 2026.

Item	Descrição da obra	Rodovia	INÍCIO km	Final Km	Faixa	Município
1	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	BR-277	10+000	62+000	FX-1 / FX-2	PARANAGUÁ/ MORRETES/ SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
2	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	PR-151	250+000	310+000	FX-1 / FX-2	Piraí do Sul/ Castro/ Carambeí
3	RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTO	BR-153	20+000	25+000	FX- 1/FX-2	Jacarezinho/ Santo Antônio da Platina

2.3 INFORMATIVO DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Seguindo as divulgações mensais com foco em prestação de serviço para usuários das rodovias da EPR Litoral Pioneiro, foram feitos materiais para os diversos canais da Concessionária, sendo eles: Instagram, Facebook, X (Twitter), Canal de WhatsApp e site da EPR Litoral Pioneiro.



Figura 01 – Post no *Instagram* com um balanço das ações realizadas durante o Maio Amarelo pela concessionária.



Figura 02 – Post no perfil do *Facebook* em alusão à Copa do Mundo com os avanços das obras de ampliação que trarão mais mobilidade e segurança aos usuários.

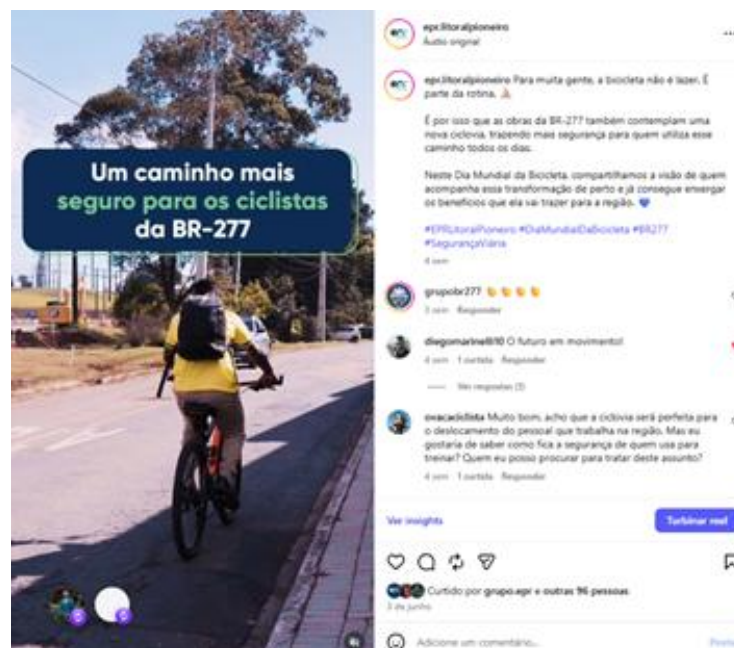


Figura 03 – Publicação no *Instagram* sobre a nova ciclovia que será implantada na BR-277 e os benefícios que a via proporcionará aos usuários.



Figura 04 – Mensagem no *Canal do WhatsApp* divulgando o 0800 na concessionária e o apoio 24h na rodovia.



Figura 05 – Post no *Facebook* destacando as bases de atendimento ao usuário presentes ao longo da rodovia para uma pausa na viagem.



Figura 06 – Publicação no X sobre o Pacto Nacional Contra o Femicídio.



Figura 07 – Mensagem no *Canal do WhatsApp* com informações sobre detonações de rocha na BR-153 e impactos na via.

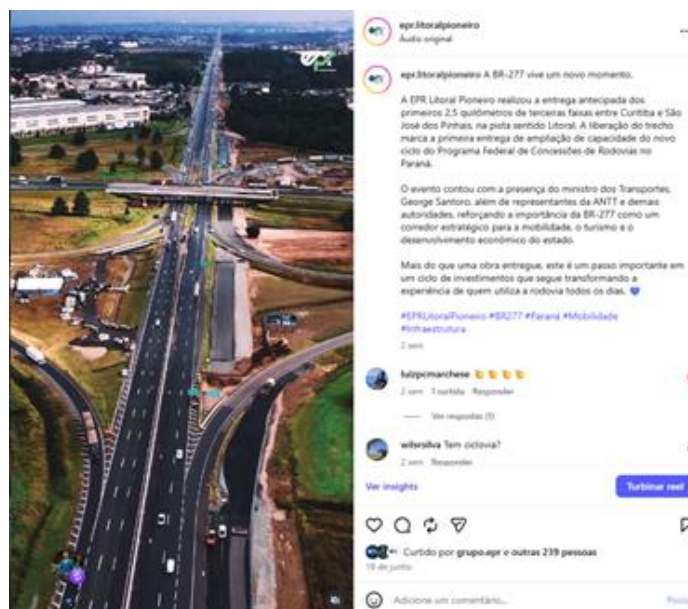


Figura 08 – Publicação no *Instagram* sobre a liberação antecipada de 2,5km de faixas da ampliação de capacidade da BR-277.



Figura 09 – Publicação no *Facebook* sobre a entrega da nova delegacia da PRF na região Metropolitana de Curitiba, na BR-277.



Figura 10 – Mensagem no *Canal do WhatsApp* sobre alteração de fluxo na BR-277 por conta de operação da içamento de vigas.



Figura 11 – Publicação no *Facebook* e *X* incentivando a escolha do motorista da rodada.

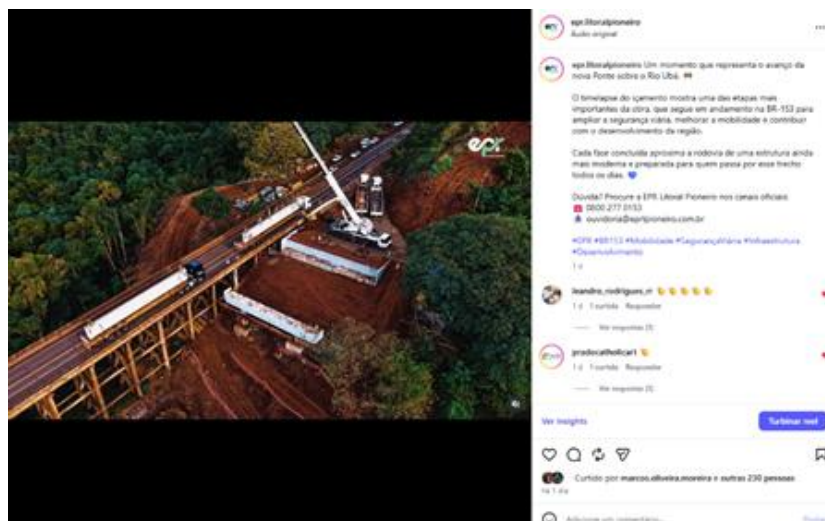


Figura 12 – Vídeo, em time-lapse no perfil do *Instagram*, detalhando o içamento de vigas que marca o avanço das obras de duplicação da BR-153.



Figura 16 – Materiais noticiosos do mês de junho disponíveis no [site da concessionária](#).



Figura 17 – Informativo mensal disponível no link: <https://eprlpioneiro.com.br/3d-flip-book/book-informativo-28-junho/>

3. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Segue abaixo fotos das principais obras e serviços realizados nas rodovias no mês de junho de 2026.

- Recuperação - Frentes de Recuperação de Pavimento





BR-151 km 258+000



BR-151 km 258+000



BR-151 km 258+000



BR-151 km 258+000



BR-151 km 257+200



BR-151 km 257+200

- Reforço, Recuperação Estrutural e Alargamento – OAE's

 10/06/2026 09:27 BR-277 Guatupê Oae 1	 05/06/2026 10:12 São José dos Pinhais EPR Litoral Pioneiro Lote 04 OAE 01/02 Km 73+500
BR-277 – OAE 01 – km 073+810 L	BR-277 – OAE 02 – km 073+790 O
 10/06/2026 09:13 Rua Sebastiana Santana Fraga Guatupê Oae 4	 28/06/2026 11:30 Rua Heitor Quinteiro Cajuru Oae 5
BR-277 – OAE 04 – km 072+770 O	BR-277 – OAE 05 – km 082+850 L/O
 29/06/2026 10:53 Rua Duarte Cesino de Medeiros Cajuru Oae 6	 13:05 16 jun. 2026 Ter Av. Jornalista Aderbal Gaertner Stresser, 11 - Cajuru, Curitiba - PR, 82970-012 EPR Litoral Pioneiro- Lote 04 OAE 08: Km 79+800
BR-277 – OAE 06 – km 82+750 L/O	BR-277 – OAE 08 – km 79+800 L/O



BR-277 – OAE 09 – km 78+490 L



BR-277 – OAE 10 km 78+490 O



BR-277 – OAE 11 km 77+440 L




BR-277 – OAE 12 km 77+440 O



BR-277 – OAE 13 – km 076+520 L



BR-277 – OAE 14 - km 76+450 O

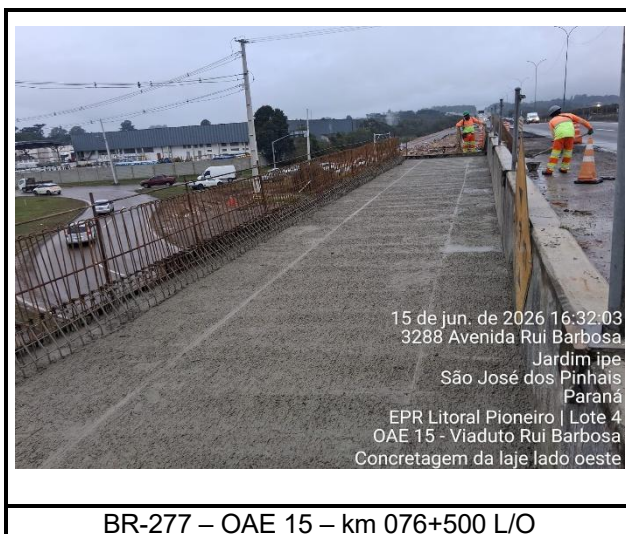

- Recuperação – Sinalização Horizontal**

 9 de jun. de 2026, 22:29:21 25° 28' 19" S, 49° 12' 40" W Bras BR 277 PR Km 80+000 ao 79+000 Decrescente	 10 de jun. de 2026, 01:36:36 25° 28' 55" S, 49° 11' 40" W Bras BR 277 PR Km 80+000 ao 77+000 Decrescente L esquerdo
BR-277 km 80 ao km 79 Leste	BR-277 km 80 ao km 77 Leste
 10 de jun. de 2026 02:01:11 3730 Rua Atilio Pic Ubera Curiti Para BR277 km 78 ao crescer pintura mecânica	 17 de jun. de 2026 12:38:11 204° S Rodovia Deputado Miguel Buta Morret Para Altitude: 9.6msnm PR-804 Km 01+000 ao 03+000 crescente e decrescente pinturas mecânicas Número de índice: 22
BR-277 km 80 ao km 79 Oeste	PR-804 Km 0 ao Km 03 Norte/Sul
 terça-feira, 9 de junho de 2026 16:41:24 22K 609052 7447256 273° W Jacarezinho Altitude: 485.0msnm Velocidade: 42.6km/h pintura de faixas equipe Jeferson	 terça-feira, 9 de junho de 2026 14:34:25 22K 607540 7440145 52° NE Jacarezinho Altitude: 485.8msnm Velocidade: 1.6km/h pintura de faixas equipe Jeferson
BR-153 KM10	BR-153 KM17

 terça-feira, 9 de junho de 2026 09:48:40 22K 609312 7448483 189° S Jacarezinho Altitude:484.4msnm Velocidade:34.5km/h pintura de faixas equipe Jeferson	 quinta-feira, 16 de abril de 2026 11:17:05 246° SW Altitude:686.1msnm Velocidade:1.8km/h pintura de faixas equipe Jeferson
BR-153 KM8  quarta-feira, 3 de junho de 2026 15:49:12 22K 623968 7374598 131° SE Altitude:660.4msnm Velocidade:0.5km/h Km 274 ao 271 pr 092 pintura de faixas equipe Jeferson	PR-092 KM267  quinta-feira, 21 de maio de 2026 15:44:59 22K 622356 7368779 131° SE Wenceslau Braz Altitude:755.6msnm Velocidade:31.8km/h pr 092 km 267 ao 264 bora e eixo pintura de faixas equipe Jeferson
PR-092 KM271  PR-151 Implantação de tacha bordo direito decrecente km 264 ao 263 30.06.2026 14:42 24.58412 -49.94383	PR-092 KM264  1 de jul. de 2026 12:20:29 121° SE Altitude:1079.0msnm Velocidade:0.0km/h PR 151 Km 304+000 ao 302+000 Decrescente Implantação de tachas mono Branca Número de índice: 673
PR-151 KM264	PR-151 KM303

 PR-151 implantação de tacha bordo direito decrecente km 264 ao 263 30.06.2026 14:41 -24.58407, -49.94380	 quarta-feira, 1 de julho de 2026 09:20:18 -04 24.68631157S 49.97692912W 40 Rodovia Parigot de Souza Vila Santa Cruz Castro Paraná PR-151 início km 277+000 ao 276+000 Decrecente
PR-151 KM 263	PR-151 KM277

- Manutenção – Sinalização Vertical**

 11:22 25 jun. 2026 Qui BR-277, 460 - Morretes, PR, 83350-000 Empresa: JC SINALIZAÇÃO Lat/Long: 25.571843°S, 48.840479°W	 Jc sinalização Sex, 19/06/2026 10:36 R. Santo Agostinho, 66 - Cajuru, Curitiba - PR, 82900-310
BR-277 Km 36 Leste	BR-277 Km 81 Leste
 Jc sinalização Sex, 19/06/2026 11:09 R. Miguel Calor, 3429 - Cajuru, Curitiba - PR, 82940-110	 10:01 26 jun. 2026 Sex Empresa: JC SINALIZAÇÃO Lat/Long: Nenhum dados
BR-277 Km 80+700 Leste	PR-508 km 28+500 Norte
 25 de jun. de 2026, 17:03:17 -23.081035, -50.252309	 29 de jun. de 2026, 11:19:07 -23.755159, -49.066909 Wenceslau Braz
BR-369 KM39	PR-092 KM269

 24 de jun. de 2026, 10:59:26 Rodovia Melo Peixoto Cambará PR 86390-000 Brasil	 18 de jun. de 2026, 12:02:52 -23.114521,-50.340120 Bandeirantes, PR
BR-369 KM38	PR-855 KM0+700
 27 de jun. de 2025, 08:38:34 -23.201481,-46.638178 Caramuru	 26 de jun. de 2026, 17:40:24 -23.120690,-50.322774 Bandeirantes
BR-153 KM25	BR-369 KM49
 09:21 24 jun. 2026 Qua Av. Senador Flavio Carvalho Guimarães, 151 KM 223 - Jaguariaíva, PR, 84200-000 Empresa: JC SINALIZAÇÃO Lat/Long: 24.320064°S, 49.778998°W	 1 de jul. de 2026, 09:22:16 -23.983664,-49.812872 Arapoti
PR-151 KM223	PR-092 KM240

- Recuperação – OAC**

 quinta-feira, 25 de junho de 2026 15:19 25°33'23,58"S 48°33'56,748"W ±1,6 BR-277, 2022 - Jardim Iguaçu, Paranaguá - PR, 83209-715, B BR 277 - KM 04 AC PINTURA DE MEIO-FIO E LIMPEZA LESTE / O Número de índice: 2	 25/06/2026 15:52 25,5567S 48,5680W Jardim Samambaia, Paranaguá - PR, 83206-410, Brasil EQUIPE DRENAGEM 02 LIMPEZA e CAIAÇÃO e REPARO BR 277 AS KM 01 - AO 00 Número de índice: 1921
BR-277 Km 04 ao Km 06	BR-277/AS Km 00 ao Km 08
 quarta-feira, 24 de junho de 2026 14:39:1 25°31'49,974"S 49°5'8,448"W ±1,90r o, 82 - Borda do Campo, São José dos Pinhais - PR, 83075-060, Bras BR 277 KM 68 AO 70. PINTURA DE MURETA LESTE / OEST Número de índice: 211	 23/06/2026 14:12 25,5088S 48,5282W Rocio SBI - Rocio, Paranaguá - PR, 83203-800, Brasil EQUIPE DRENAGEM 02 LIMPEZA e CAIAÇÃO BR 277 AS KM 00 AO 05 LESTE/OESTE Número de índice: 1848
BR-277 Km 68 ao Km 70	BR-277/BR Km 00 ao Km 03
 30 de jun. de 2026 10:40:56 Brasil Equipe DRE 01 Data 26/06/2026 BR 369 km 084+500/084+800 O	 1 de jun. de 2026 15:19 23,1557S 50,506 Equipe Civi Br Km 73+010 ao 72+ L
BR-369 KM84	BR-369 KM73



PR-092 KM312



PR-092 KM297



PR-151 KM220



PR-151 KM287



PR-151 KM304




PR-151 KM220

• **Manutenção – EPS**

 17/06/2026 14:13:35 25,522988S 49,711111W R. Estela Mari Rezende, 9851 - Borda do Campo, São José dos Pinhais - PR, 83079-300 Br 277 km 68 trocar telas amassadas implantação de base II bater pé	 17/06/2026 14:13:35 25,555873S 48,961387W s, 1551 - Vila São Vicente, Paranaíba - PR, 83215-000, Brasil Br 277 km 00+700 leste trocar um tae amassado acidente implantação de base II bater pé
BR-277 KM 68	BR-277 KM 0
 16/06/2026 11:18:28 25,584738S 48,87628W BR-277, 6875 - Morretes, PR, 83209-715, Brasil Br 277 Km 42 leste trocar defesa amassada acidente e implantação de base II bater pé	 15/06/2026 14:13:35 25,557385S 48,87628W Rod. do Café Gov. Ney Braga - Morretes, PR, 83350-000 Br 277 km 30+ implantação de base II bater pé
BR-277 KM 43	BR-277 KM 30
 terça-feira, 30 de junho de 2026 11:18:39:135 23,1275S 50,4553W ±1,70m equipe EPS 02 encarregado claudinei Br369+300 ao 369+500	 terça-feira, 30 de junho de 2026 15:05:22:160 23,1276S 50,4549W ±2,40m equipe EPS 02 encarregado claudinei Br369+300 ao 369+500

BR-369 KM67  sexta-feira, 26 de junho de 2026 14:55:41.689 23,3818S 50,0610W ±1,70m equipe EPS 02 encarregado claudinei Brl53km52+00 ambos instalação de defesa	BR-369 KM67  3 de jul. de 2026 11:05:25 Equipe EPS01 PR239 km 05+821 sentido Oeste implantação de defesa metálica
BR-153 KM51	PR-239 KM05+821

- Conservação – Canteiro Central e Faixa de Domínio**

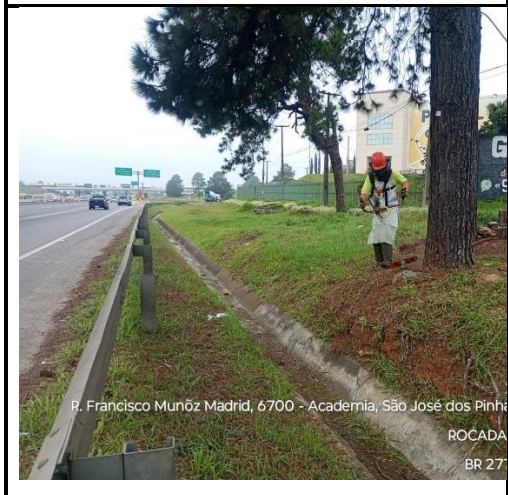 30 de jun. de 2026 11:59:07 25,448048S 48,7723 Antonina roçada man pr 408 km 0+6	 30 de jun. de 2026 11:59:07 2250 PR-411 Iapar Morretes Paraná
PR-408	PR-408
 R. Francisco Muñoz Madrid, 6700 - Academia, São José dos Pinh ROÇADA BR 277	 25/06/2026 13:2 25,447352S 48,779602W 11,40r Antonina 83370-00 Bras RM 1 roçada manual abertur coleta de lix pr 408 km 00 ao 3+500 nort
BR-277	PR-408
 25,447363S 48,7 Antoi roçada pr 408 km 00	 25 de jun. -25,560 Alt Velo roçada manu coleta de km 00 sul
PR-408	BR-277

 1 de jul. de 2026 13:59:15 TRATORISTA	 25/06/2026 16:10 23,0044S 49,9103W Ourinhos turma RM 008 Br 153 km 01 Norte contorn
BR-369 KM83	BR-153 km 1
 11/06/2026 13:59:45 23,0031S 49,9945W Ourinhos turma RM 008 Br 369 km 10 Oes	 25 de jun. de 2026 14:07:28 23,154157S 50,518255W BR 369 KM 73 oeste abertura RT 08 TRATORISTA Luis Gustavo
BR-369 KM10	BR-369 KM73
 28/05/2026 14:02:08.117 ROD PR 092 KM 315 AO 300 SENTIDO AMBOS E DISPONIVEL TRATORISTA CARLOS EQUIPE RT 006	 22 de jun. de 2026 10:07:44 23,5675S 49,8877W BR 092 km 298 Sul RM 007
PR-092 KM315	PR-092 KM298

 01/07/2026 13:41 Ponta Grossa PR151 km 319 315 leste 4 metros+coleta de lixo #RM002	 3 de jul. de 2026 11:58:01 Bengualinha equipe rm011 rodovia PR 092 Km 240 ao 233 sul roçada 4 metros + coleta de lixo
PR-151 KM319	PR-092 KM240
 3 de jul. de 2026 09:28:59 374 Avenida Senador Flavio Carvalhaes Guimaraes Carambei Paraná rm 005 km 307 ao 319 canteiro central Número de índice: 418	 2 de jul. de 2026 15:58:24 515 PR-151 Castro Paraná PR 151 km 298 canteiro central roçada manual
PR-151 KM307	PR-151 KM298

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Referências: N/A.

5. TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente relatório mensal se completa com 36 folhas devidamente identificadas e numeradas.
